Descripcion	Dias Cal.	Duración	Inicio	Fin	Predecesora	Modo de Tarea	% Avance
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA FERIAL	153	131	01/09/2022	31/01/2023			0.683296
PAVIMENTOS	149	128	01/09/2022	27/01/2023			1.121305
OBRAS PROVISIONALES	6	5	01/09/2022	06/09/2022			0
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60m x 2.40m	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
OFICINA Y ALMACEN DE OBRA (ALQUILER)	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO DE OBRA	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PARA LA OBRA	2	2	05/09/2022	06/09/2022			0
FLETE TERRESTRE	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
SEGURIDAD Y SALUD	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDA	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TRABAJO DEL COVID-19	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA COVID-19	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
AMBIENTE PARA CONTROL DE DESINFECCION COVID 19 - TOPICO	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
AMBIENTE DE TOPICO PARA CONTROL COVID Y EMERGENCIAS	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
TRABAJOS PRELIMINARES	21	18	07/09/2022	27/09/2022			0
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	8	7	07/09/2022	14/09/2022			0
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	13	11	15/09/2022	27/09/2022	19		0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	25	22	06/09/2022	30/09/2022			0
CORTE Y EXCAVACION A NIVEL DE SUB BASE	18	17	06/09/2022	24/09/2022	7		0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	23	20	08/09/2022	30/09/2022			0
MURO DE CONTENCION	10	9	12/09/2022	21/09/2022			0
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	3	3	15/09/2022	17/09/2022	19		0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	1	1	19/09/2022	19/09/2022	25		0
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	1	1	20/09/2022	20/09/2022	26		0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	8	7	12/09/2022	19/09/2022			0
MURO DE CONTECCION: CONCRETO f´c= 210 Kg/cm2	2	2	20/09/2022	21/09/2022	28		0
ACERO CORRUGADO D= 1/2" fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1	1	12/09/2022	12/09/2022	28CC		0
CANAL EXISTENTE	13	11	15/09/2022	27/09/2022			0
LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE	2	2	19/09/2022	20/09/2022	33		0
DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE	3	3	15/09/2022	17/09/2022	19		0
MURO EN CANAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4	4	21/09/2022	24/09/2022	32		0
MURO EN CANAL: ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	3	3	21/09/2022	23/09/2022	32		0
MURO EN CANAL: CONCRETO f´c = 210 kg/cm2	2	2	26/09/2022	27/09/2022	34		0
LOSA EN CANAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3	3	21/09/2022	23/09/2022	32		0
LOSA EN CANAL: CONCRETO f´c = 210 kg/cm2	4	4	23/09/2022	26/09/2022	37		0
LOSA EN CANAL: ACERO CORRUGADO D= 1/2" kg/cm2 GRADO 6	3	3	21/09/2022	23/09/2022	32		0
PAVIMENTO	148	127	02/09/2022	27/01/2023			1.598837
PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE	11	9	02/09/2022	12/09/2022	4		0
MEJORAMIENTO DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	37	32	14/09/2022	20/10/2022			0
MEJORAMIENTO: EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL P	6	5	14/09/2022	19/09/2022			0
MEJORAMIENTO: ZARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/ M	5	5	19/09/2022	23/09/2022	43		0
MEJORAMIENTO: CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL (ME	11	9	23/09/2022	03/10/2022	44		0
MEJORAMIENTO: CONFORMACION DE SUB RASANTE E= 0.20 m	18	16	03/10/2022	20/10/2022	45		0
CAPA GRANULAR - SUB BASE DE 0.20 m	49	42	13/09/2022	31/10/2022			0
CANTERA DE RIO: EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL	4	4	26/09/2022	29/09/2022	22		0
CANTERA DE RIO: ZARANDEROS DE MATERIAL	6	5	30/09/2022	05/10/2022	48		0
CANTERA DE RIO: CARGUIO Y TRANSPORTE	7	6	06/10/2022	12/10/2022	49		0
MATERIAL S/BASE: EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL	7	6	30/09/2022	06/10/2022	48		0
MATERIAL S/BASE: ZARANDEROS DE MATERIAL	9	8	06/10/2022	14/10/2022	49		0
MATERIAL S/BASE: CARGUIO Y TRANSPORTE	9	8	13/10/2022	21/10/2022	50		0
MEZCLADO: MATERIAL DE RIO 35% + MATERIAL SELECCIONA	12	10	20/10/2022	31/10/2022	52,46		0
CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL MEZCLADO PARA SUB	7	6	13/09/2022	19/09/2022	41		0
CONFORMACION DE SUB BASE E= 0.20 m	15	13	20/09/2022	04/10/2022	55		0
PAVIMENTO DE CONCRETO	92	79	28/10/2022	27/01/2023			2.879581
PAVIMENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	35	30	28/10/2022	01/12/2022			0
PAVIMENTO: CONCRETO f´c = 210 kg/cm2	34	30	31/10/2022	03/12/2022	73		0
PAVIMENTO: ACERO DE JUNTA LONGITUDINAL fy=4200 kg/cm	7	6	28/10/2022	03/11/2022			0
PAVIMENTO: ACERO DE JUNTA TRANSVERSAL fy=4200 kg/cm2	11	9	28/10/2022	07/11/2022			0
PAVIMENTO: JUNTAS ASFALTICAS	5	4	01/12/2022	05/12/2022	59		100
CURADO DEL PAVIMENTO	58	50	01/12/2022	27/01/2023			0
VEREDAS	133	114	15/09/2022	25/01/2023			1.061947
MOVIMIENTO DE TIERRAS	19	17	03/10/2022	21/10/2022			0
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	17	15	03/10/2022	19/10/2022			0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	3	3	19/10/2022	21/10/2022	66		0
DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	2	2	15/09/2022	16/09/2022			0
DEMOLICION DE MANUAL DE VEREDAS EXISTENTES	2	2	15/09/2022	16/09/2022	19		0
OBRAS DE CONCRETO	37	32	04/10/2022	09/11/2022			2.586207
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS	17	15	04/10/2022	20/10/2022	66		0
VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	13	11	05/10/2022	17/10/2022			0
VEREDA: CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 e=10cm	25	22	05/10/2022	26/10/2022	56		0
VEREDA: ACABADO, BRUÑADO Y COLOREADO	25	22	05/10/2022	26/10/2022			9.677419
VEREDA: JUNTAS DE DILATACION	7	6	03/11/2022	09/11/2022	76		0
CURADO DE VEREDAS	7	6	27/10/2022	02/11/2022	74		0
RAMPAS	32	27	30/09/2022	31/10/2022			0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	13	11	01/10/2022	13/10/2022			0
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	11	9	01/10/2022	11/10/2022			0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	3	3	11/10/2022	13/10/2022	79		0
OBRAS DE CONCRETO	32	27	30/09/2022	31/10/2022			0
AFIRMADO DE 4" PARA RAMPAS	13	11	30/09/2022	12/10/2022	80		0
RAMPAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	13	11	19/10/2022	31/10/2022			0
RAMPAS: CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 - E=4"	17	15	05/10/2022	21/10/2022	56		0
RAMPAS: ACABADO, BRUÑADO Y COLOREADO	17	15	05/10/2022	21/10/2022			0
CURADO DE RAMPAS	1	1	25/10/2022	25/10/2022	84		0
MARTILLOS	12	10	20/10/2022	31/10/2022			0
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	8	7	20/10/2022	27/10/2022			0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	4	3	28/10/2022	31/10/2022	88		0
PISOS ACABADO, BRUÑADO Y COLOREADO	90	77	28/10/2022	25/01/2023			0
PISOS: CONCRETO f´c = 175 Kg/cm2	90	77	28/10/2022	25/01/2023			0
PISOS: EN MARTILOS - CONCRETO f´c = 175Kg/cm2 - COLORE	4	3	28/10/2022	31/10/2022	88		0
PISOS: EN BERMA CENTRAL - CONCRETO f´c = 175 Kg/cm2 - C	28	24	29/11/2022	25/01/2023	129		0
SARDINEL	49	42	02/12/2022	19/01/2023			0
OBRAS DE CONCRETO	29	25	02/12/2022	30/12/2022			0
SARDINEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	14	12	02/12/2022	15/12/2022			0
SARDINEL: CONCRETO f´c = 175 kg/cm2	11	10	05/12/2022	15/12/2022	59		0
SARDINEL: REVESTIMIENTO CON MORTERO MEZCLA 1:4	25	22	06/12/2022	30/12/2022			0
CURADO DE SARDINELES	6	6	15/12/2022	21/12/2022	97		0
SARDINEL: JUNTAS ASFALTICAS	6	5	21/12/2022	26/12/2022	99		0
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	30	26	21/12/2022	19/01/2023			0
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN SARDINELES (MEZCLA C:A 1:5, E	17	15	21/12/2022	06/01/2023	99		0
COLOCACION DE PIEDRA LAJA VERTICAL (70x70x6cm) GRIS	13	12	06/01/2023	19/01/2023	102		0
CUNETAS	39	34	31/10/2022	08/12/2022			0
BERMA CENTRAL	61	52	02/12/2022	31/01/2023			0
BANCAS	38	33	21/12/2022	27/01/2023			0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	7	6	21/12/2022	27/12/2022			0
EXCAVACION DE ZANJAS	3	3	21/12/2022	23/12/2022	99		0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	4	4	23/12/2022	27/12/2022	111		0
BANCAS DE CONCRETO	19	17	27/12/2022	14/01/2023			0
BANCA DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	8	7	27/12/2022	03/01/2023	112		0
BANCA DE CONCRETO: ACERO fy=4200 kg/cm2	7	6	27/12/2022	02/01/2023	112		0
BANCA DE CONCRETO: CONCRETO f´c=210 Kg/cm2	12	11	03/01/2023	14/01/2023	114		0
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	12	11	16/01/2023	27/01/2023			0
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO BANCAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.	5	5	16/01/2023	20/01/2023	116		0
REVESTIMIENTO BANCAS DE CONCRETO CON PIEDRA LAJA GRI	8	7	20/01/2023	27/01/2023	118		0
TACHOS DE BASURA	8	7	24/01/2023	31/01/2023			0
TACHOS DE PLASTICO P/ BASURA DE 1100 LITROS	8	7	24/01/2023	31/01/2023			0
AREAS VERDES	13	12	16/01/2023	28/01/2023			0
JARDINERIA CON BANCA DE CONCRETO	12	11	16/01/2023	27/01/2023	116		0
PREPARACION DE TERRENO PARA AREAS VERDES	13	12	16/01/2023	28/01/2023	116		0
SEMBRIO DE ARBUSTOS	2	2	16/01/2023	17/01/2023	116		0
SEMBRIO DE FLORES NATIVAS	6	6	16/01/2023	21/01/2023	116		0
SEMBRIO DE GRASS	3	3	16/01/2023	18/01/2023	116		0
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	61	52	02/12/2022	31/01/2023			0
MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL (SEGÚN DISEÑO)	16	14	14/12/2022	29/12/2022	130		0
TUBERIA PVC - P 16mm	13	11	02/12/2022	14/12/2022			0
TUBERIA PVC - P 25mm	13	11	02/12/2022	14/12/2022			0
CABLEADO CONDUCTOR 16mm2 NYY	13	11	02/12/2022	14/12/2022			0
CABLEADO CONDUCTOR 25mm2 TW	8	7	02/12/2022	09/12/2022			0
TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO P/ DISTRIBUCION 24 POLOS	8	7	29/12/2022	05/01/2023	129		0
CAJA DE PASO F.G. DE 150x150x75mm	8	7	29/12/2022	05/01/2023	129		0
POSTE ORNAMENTALTIPO FARO + LUMINARIA	7	6	25/01/2023	31/01/2023	93		0
SEÑALIZACION VIAL	38	33	12/12/2022	18/01/2023			0
SEÑALIZACION	38	33	12/12/2022	18/01/2023			0
PINTADO EN SARDINEL	8	7	12/12/2022	19/12/2022	62		0
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS	8	7	11/01/2023	18/01/2023			0
PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAS	6	5	22/12/2022	27/12/2022	143		0
SEÑALES VERTICALES	32	28	12/12/2022	12/01/2023			0
FABRICACION DE SEÑALES PREVENTIVAS	3	3	20/12/2022	22/12/2022	139		0
FABRICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS	2	2	11/01/2023	12/01/2023			0
FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS	2	2	12/12/2022	13/12/2022			0
PRUEBAS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD	139	119	01/09/2022	17/01/2023			0
DISEÑO DE MEZCLAS	95	80	01/10/2022	03/01/2023			0
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO	1	1	01/09/2022	01/09/2022			0
ÁNALISIS GRANULOMETRICO	1	1	02/09/2022	02/09/2022			0
CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)	5	4	01/09/2022	05/09/2022			0
ROTURA DE BRIQUETAS	89	72	11/10/2022	17/01/2023			0
PROCTOR	5	4	01/09/2022	05/09/2022			0
DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA)	35	30	01/09/2022	05/10/2022			0
VARIOS	92	79	30/09/2022	30/12/2022			0
NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	5	4	30/09/2022	04/10/2022			0
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	3	3	28/12/2022	30/12/2022	141		0
IMPACTO AMBIENTAL	5	4	27/01/2023	31/01/2023			0
RESTAURACION DE CANTERAS	4	4	27/01/2023	31/01/2023	119		0
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADEROS	4	4	28/01/2023	31/01/2023	158		0

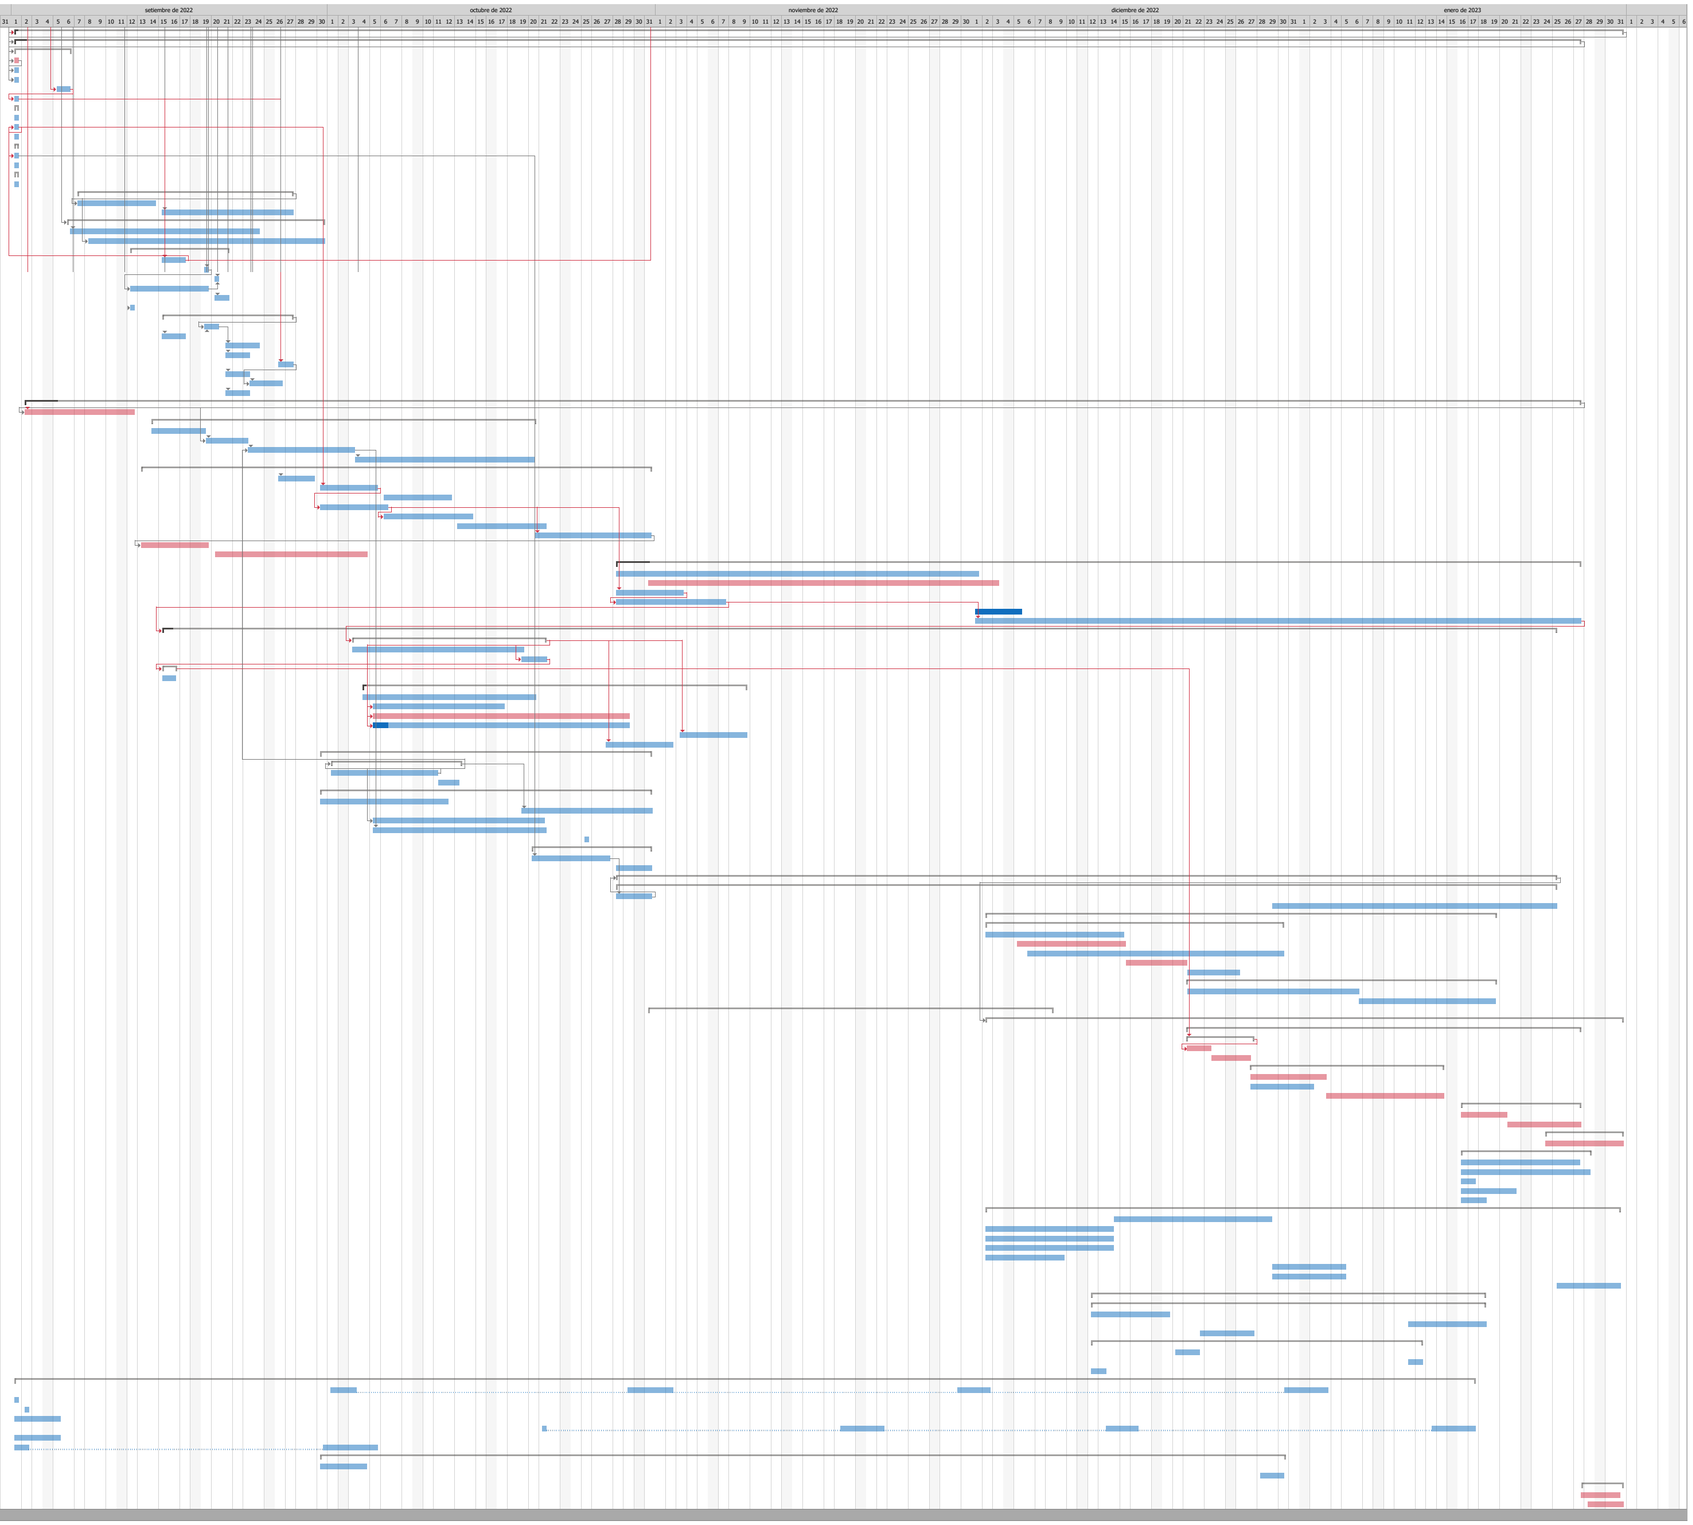

Tarea Programada
Critical
Hito
Resumen de Tarea

Progreso
División de Tarea
Critical Split
